

**Dodávateľ :**

VK STAV s.r.o.

Radlinského 17

052 01 Spišská Nová Ves

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31703470

DIČ: 2020504475

IČ DPH : SK2020504475

Zápis v obch.registri OS Košice I vl.č. 5818/V odd. Sro

Banka : Dexia banka Slovensko a.s. Sp.Nová Ves

SWIFT :

Číslo účtu : 7514905001/5600

IBAN :

Tel.: 053/4410346

Fax : 053/4410346

Faktúru vyhotovil : Kleinová Ľudmila

**Faktúra číslo :****2011-037**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:****Dom dôchodcov n.o.**

Letná 352/8

053 33 Nalepkovo

**Odberateľ :**

Dom dôchodcov n.o.

Letná 352/8

053 33 Nalepkovo

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31257305

DIČ: 2021785139

IČ DPH :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

15.12.2011

15.12.2011

**30.12.2011**

Forma úhrady : PP

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol : 0308

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám na základe ZoD zo dňa 25.10.2011 a dodatku č. 1 zo dňa 24.11.2011:**

| P.č. | Kód položky | Popis                                                                                                           | DPH % | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Spolu bez DPH |
|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----|--------------------|---------------|
|      |             | za prevedené stavebné práce podľa priloženého súpisu vykonaných prác<br>Stavba: Oprava kúpeľní v dome dôchodcov | 20    | 1        | 1  | 8 895,720          | 8 895,72      |

Základ pre DPH 20 % : 8 895,72

DPH 20 % : 1 779,14

Celková suma s DPH

**10 674,86**

Celková fakturovaná suma: EUR

**10 674,86**

Cena dohodou

Podpis a pečiatka :

**VK STAV s.r.o.**  
Radlinského 17 052 01 Sp. Nová Ves  
IČO: 31703470 IČ DPH: SK2020504475

# KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 2.11.-15.12.2011

Názov stavby **Oprava kúpeľní v domove dôchodcov**  
**Oprava kúpeľne M309, M3.09 Naviac práce, M 3.09**  
**Odpočet menej prác - zmena dispozície, Sprcha I.**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Dom dôchodcov Nálepko n.o.

Projektant

Zhotoviteľ VK STAV s.r.o., Spišská Nová Ves

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

15.12.2011

## Náklady čerpania v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         | B Doplnkové náklady |                                                                                                 | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                      |                        |                     |           |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|-----------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 1 313,06            | 8                                                                                               | Práce cezčas                   | 0,00                 | 13                     | GZS                 | 0,00      |
| 2                        |              | Montáž  | 1 935,30            | 9                                                                                               | Bez pevnej podl.               | 0,00                 | 14                     | Mimostaven. doprava | 0,00      |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 1 683,61            | 10                                                                                              | Kultúrna pamiatka              | 0,00                 | 15                     | Sťažené podmienky   | 0,00      |
| 4                        |              | Montáž  | 2 333,57            | 11                                                                                              |                                | 0,00                 | 16                     | Vplyv prostredia    | 0,00      |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00                |                                                                                                 |                                |                      | 17                     | Klimatické vplyvy   | 0,00      |
| 6                        |              | Montáž  | 962,18              |                                                                                                 |                                |                      | 18                     | VRN z rozpočtu      | 0,00      |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 8 227,72            | 12                                                                                              | DN (r. 8-11)                   | 0,00                 | 19                     | VRN (r. 13-18)      | 0,00      |
| 20                       | HZS          |         | 668,00              | 21                                                                                              | Kompl. činnosť                 | 0,00                 | 22                     | Ostatné náklady     | 0,00      |
| Projektant               |              |         |                     |                                                                                                 |                                | D Celkové náklady    |                        |                     |           |
| Dátum a podpis           |              |         |                     | Pečiatka                                                                                        |                                | 23                   | Súčet 7, 12, 19-22     |                     | 8 895,72  |
| Objednávateľ             |              |         |                     |                                                                                                 |                                | 24                   | DPH 20,00 % z 8 895,72 |                     | 1 779,13  |
|                          |              |         |                     |                                                                                                 |                                | 25                   | Cena s DPH (r. 23-24)  |                     | 10 674,85 |
| Dátum a podpis           |              |         |                     | Pečiatka                                                                                        |                                | E Prípochy a odpočty |                        |                     |           |
| Zhotoviteľ               |              |         |                     | VK stav s.r.o. -3-<br>Radlinského 17, 052 01 Sp. Nová Ves<br>IČO 31703470, IČ DPH: SK2020504475 |                                | 26                   | Dodávky objednávateľa  |                     | 0,00      |
| Dátum a podpis           |              |         |                     | Pečiatka                                                                                        |                                | 27                   | Kízavá doložka         |                     | 0,00      |
|                          |              |         |                     |                                                                                                 |                                | 28                   | Zvýhodnenie + -        |                     | 0,00      |

*Príloha Dohoda*  
**Vážny lístok č.: 1484/11/2011 - P** Kópia!

Brantner Nova, s.r.o., SNV, Sadová 13, 052 01 Sp.N.Ves, IČO: 31659641, Reg.skládka odp. Kúdelník II

Pôvodca :

VK STAV s.r.o.

Radlinského 17

Sp.Nová Ves

IČO : 31703470

Prepravca :

Cudzí:

IČO :

ŠPZ: SN 746BJ

ŠPZ práv.:

Meno vodiča: Jesze

Názov odpadu :

**ZMIEŠANÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ**

Kód odpadu : **17 09 04**

Ktg. : **O**

Y kód :

1. váženie 15.12 t 24.11.2011 12:31:31

Lizák

2. váženie 9.24 t 24.11.2011 12:41:13

Lizák

**Netto 5.88 t**

----- Vážené váhou Tenzona -----

**Vážny lístok č.: 1592/11/2011 - P** Kópia!

Brantner Nova, s.r.o., SNV, Sadová 13, 052 01 Sp.N.Ves, IČO: 31659641, Reg.skládka odp. Kúdelník II

Pôvodca :

VK STAV s.r.o.

Radlinského 17

Sp.Nová Ves

IČO : 31703470

Prepravca :

Cudzí:

IČO :

ŠPZ: SN 746BJ

ŠPZ práv.:

Meno vodiča: Jesze

Názov odpadu :

**ZMIEŠANÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ**

Kód odpadu : **17 09 04**

Ktg. : **O**

Y kód :

1. váženie 12.90 t 28.11.2011 11:22:50

Lizák

2. váženie 9.18 t 28.11.2011 11:32:53

Lizák

**Netto 3.72 t**

----- Vážené váhou Tenzona -----

## Rekapitulácia čerpania stavby

**Stavba:** Oprava kúpelní v domove dôchodcov

Objednávateľ: Dom dôchodcov Nálepko n.o.

Zhotoviteľ: VK STAV s.r.o., Spišská Nová Ves

Od: 2.11.2011

Do: 15.12.2011

| Kód           | Zákazka                                                             | Cena bez DPH     | DPH             | Cena s DPH        | Náklad prestavané |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 1             | 2                                                                   | 3                | 4               | 5                 | 6                 |
| 01            | Oprava kúpelní z dôvodu ich havarijného stavu - Kúpeľňa M309        | 5 351,350        | 1 070,27        | 6 421,620         | 0,000             |
| M309NP        | 01 Oprava kúpelne M3.09 - Naviac práce                              | 1 674,770        | 334,95          | 2 009,720         | 0,000             |
| M309odpočet   | 01 Oprava kúpelne M3.09 - Odpočet menej prác - upravená dispozícia  | -671,480         | -134,30         | -805,780          | 0,000             |
| 02            | Oprava kúpelní z dôvodu ich havarijného stavu - Sprcha I. poschodie | 1 276,520        | 255,30          | 1 531,820         | 0,000             |
| 03            | Oprava kúpelní z dôvodu ich havarijného stavu - Sprcha prízemie     | 1 264,560        | 252,91          | 1 517,470         | 0,000             |
| <u>Celkom</u> |                                                                     | <u>8 895,720</u> | <u>1 779,13</u> | <u>10 674,850</u> | <u>0,000</u>      |

 VK STAV s.r.o.

Radlinského 17, 052 01 Sp. Nová Ves  
IČO: 31703470, IČ DPH: SK2020504475

Súpis vykonaných prác

Stavba: Oprava kúpeľní v domove dôchodcov

Objekt: 01 Oprava kúpeľne M3.09 - Naviac práce

JKSO:

Miesto:

Obdobie: 2.11.-15.12.2011

Objednávateľ: Dom dôchodcov Nálepko n.o.

Zhotoviteľ: VK STAV s.r.o., Spišská Nová Ves

Dátum: 15.12.2011

Spracoval:

| P.Č | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Výkon | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť jednotková | Hmotnosť celkom | Prestavané [MJ] | Prestavané |
|-----|-----|-------------|-------|----|-------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1   | 2   | 3           | 4     | 5  | 6     | 7               | 8           | 9                   | 10              | 11              | 12         |

| PSV  |     | Práce a dodávky PSV                  |                                                                                         |     |        |         | 1 088,427 |         | 0,533 |       | 0,000 |       |
|------|-----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 725  |     | Zdravotechnika - zariadení. predmety |                                                                                         |     |        |         | 386,771   |         | 0,164 |       | 0,000 |       |
| 1    | 721 | 725530823                            | Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l 0,15500 t | súb | 1,000  | 7,731   |           | 0,00000 |       | 0,000 | 0,00  | 0,000 |
| 2    | 721 | 725539105                            | Montáž tlakového ohrievača do 160 l                                                     | súb | 1,000  | 53,383  |           | 0,02895 |       | 0,029 | 0,00  | 0,000 |
| 3    | 484 | 4843888500                           | Ohrievač vody zásobníkový elektrický 200l                                               | ks  | 1,000  | 324,500 |           | 0,13500 |       | 0,135 | 0,00  | 0,000 |
| 4    | 721 | 998725202                            | Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m                 | %   | 3,856  | 0,300   |           | 0,00000 |       | 0,000 | 0,00  | 0,000 |
| 771  |     | Podlahy z dlaždíc                    |                                                                                         |     |        |         | 18,003    |         | 0,320 |       | 0,000 |       |
| 5    | 597 | 597641290b                           | Dlaždice keramické - dopravné a obstarávacie náklady 10%                                | m2  | 16,000 | 1,083   |           | 0,02000 |       | 0,320 | 0,00  | 0,000 |
| 6    | 771 | 998771202                            | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m                       | %   | 0,173  | 3,900   |           | 0,00000 |       | 0,000 | 0,00  | 0,000 |
| 781  |     | Dokončovacie práce a obklady         |                                                                                         |     |        |         | 683,653   |         | 0,049 |       | 0,000 |       |
| 7    | 597 | 59765800                             | Obkladačky - cenový rozdiel - požiadavka investora                                      | kpl | 1,000  | 536,740 |           | 0,02100 |       | 0,021 | 0,00  | 0,000 |
| 8    | 597 | 59765800a                            | Obkladačky - dopravné a obstarávacie náklady                                            | kpl | 1,000  | 53,674  |           | 0,02100 |       | 0,021 | 0,00  | 0,000 |
| 9    | 771 | 781545210                            | Montáž obkladov listely do tmelu                                                        | m   | 12,600 | 6,232   |           | 0,00056 |       | 0,007 | 0,00  | 0,000 |
| 10   | 771 | 998781202                            | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m                       | %   | 6,689  | 2,200   |           | 0,00000 |       | 0,000 | 0,00  | 0,000 |
| M    |     | Práce a dodávky M                    |                                                                                         |     |        |         | 586,344   |         | 0,000 |       | 0,000 |       |
| 21-M |     | Elektromontáže                       |                                                                                         |     |        |         | 586,344   |         | 0,000 |       | 0,000 |       |
| 11   | 921 | 2100                                 | Elektroinštalácia - pozri rozpis                                                        | kpl | 1,000  | 570,930 |           | 0,00000 |       | 0,000 | 0,00  | 0,000 |


| P.Č | KCN | Kód položky | Popis                                      | MJ | Výkon | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť jednotková | Hmotnosť celkom | Prestavané [MJ] | Prestavané |
|-----|-----|-------------|--------------------------------------------|----|-------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1   | 2   | 3           | 4                                          | 5  | 6     | 7               | 8           | 9                   | 10              | 11              | 12         |
| 12  | 921 | 2100b       | Elektroinštalácia - kompletizačná prídržka | %  | 2,700 | 5,709           | 15,414      | 0,00000             | 0,000           | 0,00            | 0,000      |

Celkom

1 674,771

0,533

0,000

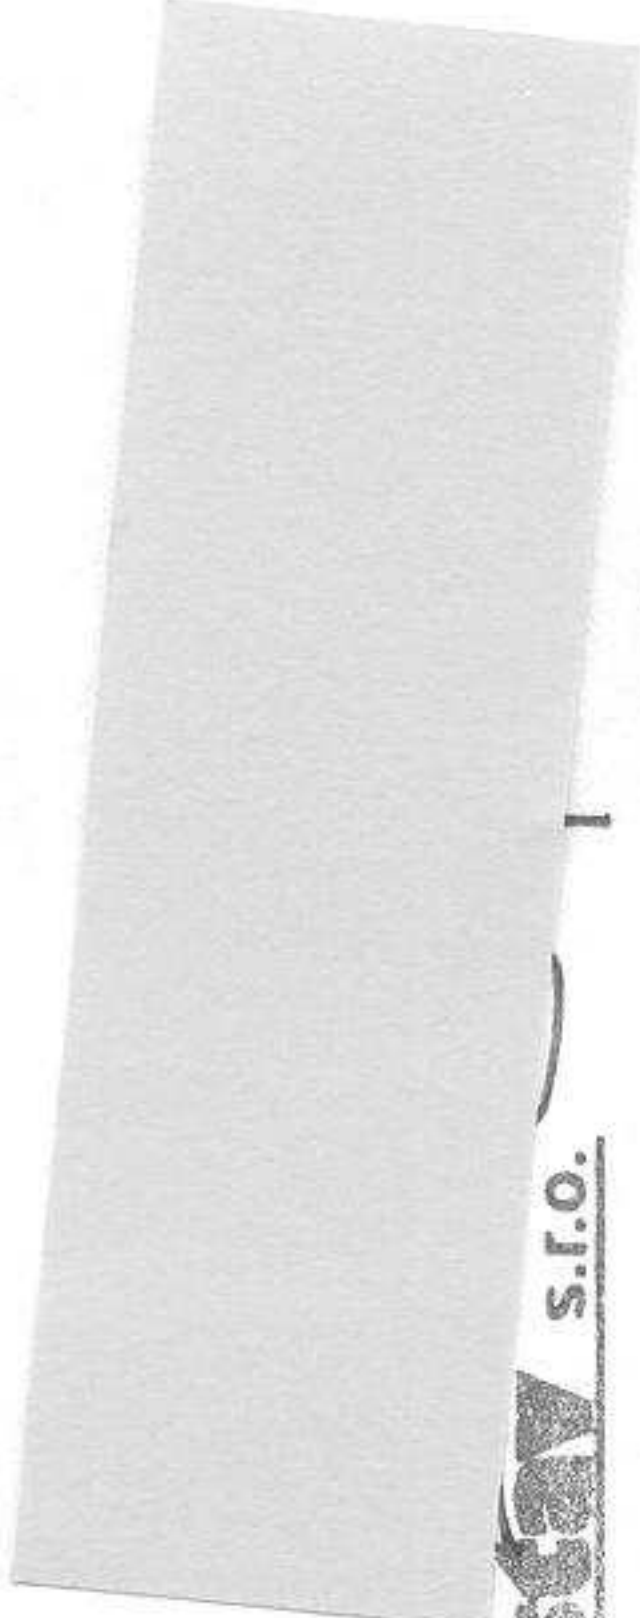

Radlinského 17, 052 01 Sp. Nová Ves  
IČO 31703470, IČ DPH SK2020504475

# Súpis vykonaných prác

Stavba: Oprava kúpeľní v domove dôchodcov  
Objekt: Oprava kúpeľní z dôvodu ich havarijného stavu - Kúpeľňa M309

JKSO:  
Miesto:

Obdobie: 2.11.-15.12.2011

Objednávateľ: Dom dôchodcov Nálepko n.o.  
Zhotoviteľ: VK STAV s.r.o., Spišská Nová Ves  
Dátum: 15.12.2011  
Spracoval:

| P.Č | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Výkon | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť jednotková | Hmotnosť celkom | Prestavané [MJ] | Prestavané |
|-----|-----|-------------|-------|----|-------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1   | 2   | 3           | 4     | 5  | 6     | 7               | 8           | 9                   | 10              | 11              | 12         |

| HSV |     | Práce a dodávky HSV                |                                                                          |    |        |        | 1 706,592 | 5,214   | 0,000 |       |
|-----|-----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|---------|-------|-------|
| 3   |     | Zvislé a kompletné konštrukcie     |                                                                          |    |        |        | 59,458    | 0,259   | 0,000 |       |
| 1   | 011 | 342272103                          | Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.125,P3-550    | m2 | 2,960  | 20,087 | 59,458    | 0,08766 | 0,259 | 0,000 |
| 6   |     | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |                                                                          |    |        |        | 569,824   | 4,931   | 0,000 |       |
| 2   | 011 | 612421626                          | Vnúťorná omietka vápenná alebo vápennocementová stien jadro              | m2 | 11,840 | 5,335  | 63,166    | 0,04413 | 0,523 | 0,000 |
| 3   | 011 | 612421637                          | Vnúťorná omietka vápenná alebo vápennocementová stien štuk               | m2 | 11,840 | 7,141  | 84,549    | 0,04766 | 0,564 | 0,000 |
| 4   | 011 | 612451121                          | Vnúťorná cementová omietka v podlaží a v schodisku muríva hladká         | m2 | 25,355 | 6,566  | 166,481   | 0,04557 | 1,155 | 0,000 |
| 5   | 011 | 632451136                          | Poter pieskovocementový hladený dreveným hladidlom hr. do 50 mm do spádu | m2 | 21,530 | 8,889  | 191,380   | 0,12209 | 2,629 | 0,000 |
| 6   | 011 | 642942111                          | Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2                 | ks | 2,000  | 8,369  | 16,738    | 0,01886 | 0,038 | 0,000 |
| 7   | 553 | 5533194600                         | Zárubňa oceľová CGU 90x197x10cm                                          | ks | 2,000  | 23,755 | 47,510    | 0,01130 | 0,023 | 0,000 |

| 9  |     | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |                                                                                                 |    |        |        | 948,300 | 0,023   | 0,000 |      |       |
|----|-----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|---------|---------|-------|------|-------|
| 8  | 013 | 962031132                           | Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,196 t                    | m2 | 27,160 | 2,924  | 79,416  | 0,00069 | 0,019 | 0,00 | 0,000 |
| 9  | 013 | 965042120                           | Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.do 100 mm -2,200 t | m3 | 1,077  | 71,539 | 77,048  | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 10 | 013 | 965081812                           | Búranie dlažieb keramických -0,065 t                                                            | m2 | 10,370 | 2,494  | 25,863  | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 11 | 013 | 968061125                           | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2                           | ks | 3,000  | 0,508  | 1,524   | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 12 | 013 | 968062455                           | Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t                                       | m2 | 4,200  | 5,180  | 21,756  | 0,00115 | 0,005 | 0,00 | 0,000 |
| 13 | 013 | 973031813                           | Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 150 mm -0,010 t                           | m  | 11,200 | 5,648  | 63,258  | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |

| P.Č | KCN | Kód položky | Popis                                                                   | MJ | Výkon  | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť jednotková | Hmotnosť celkom | Prestavané [MJ] | Prestavané |
|-----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1   | 2   | 3           | 4                                                                       | 5  | 6      | 7               | 8           | 9                   | 10              | 11              | 12         |
| 14  | 013 | 978059511   | Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2 -0,068 t   | m2 | 28,600 | 4,580           | 130,988     | 0,00000             | 0,000           | 0,00            | 0,000      |
| 15  | 013 | 978071311   | Odstránenie tepelnej izolácie z dosiek hr. do 50 mm -0,093 t            | m2 | 8,680  | 3,998           | 34,703      | 0,00000             | 0,000           | 0,00            | 0,000      |
| 16  | 013 | 979011131   | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m                        | t  | 11,663 | 14,119          | 164,670     | 0,00000             | 0,000           | 0,00            | 0,000      |
| 17  | 013 | 979011141   | Príplatok za každých ďalších 3.5 m                                      | t  | 23,326 | 4,431           | 103,358     | 0,00000             | 0,000           | 0,00            | 0,000      |
| 18  | 013 | 979081111   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                       | t  | 11,663 | 10,034          | 117,027     | 0,00000             | 0,000           | 0,00            | 0,000      |
| 19  | 013 | 979081121   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km           | t  | 58,315 | 0,362           | 21,110      | 0,00000             | 0,000           | 0,00            | 0,000      |
| 20  | 013 | 979082111   | Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                | t  | 11,663 | 6,376           | 74,363      | 0,00000             | 0,000           | 0,00            | 0,000      |
| 21  | 013 | 979082121   | Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t  | 46,652 | 0,712           | 33,216      | 0,00000             | 0,000           | 0,00            | 0,000      |

|                           |     |           |                                                                                   |                |       |        |         |              |       |      |       |
|---------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|---------|--------------|-------|------|-------|
| <b>99 Presun hmôt HSV</b> |     |           |                                                                                   | <b>129,010</b> |       |        |         | <b>0,000</b> |       |      |       |
| 22                        | 014 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t              | 5,214 | 24,743 | 129,010 | 0,00000      | 0,000 | 0,00 | 0,000 |

|                                           |     |           |                                                                     |                  |        |        |         |              |       |      |       |
|-------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|---------|--------------|-------|------|-------|
| <b>PSV Práce a dodávky PSV</b>            |     |           |                                                                     | <b>3 389,936</b> |        |        |         | <b>1,775</b> |       |      |       |
| <b>711 Izolácie proti vode a vlhkosti</b> |     |           |                                                                     | <b>291,572</b>   |        |        |         | <b>0,000</b> |       |      |       |
| 23                                        | 711 | 711462302 | Zhotovenie izolácie - Tekutá hydroizolácia 2x náter                 | m2               | 22,440 | 12,658 | 284,046 | 0,00000      | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 24                                        | 711 | 998711202 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m | %                | 2,840  | 2,650  | 7,526   | 0,00000      | 0,000 | 0,00 | 0,000 |

|                             |     |            |                                                                               |               |        |       |        |              |       |      |       |
|-----------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|--------|--------------|-------|------|-------|
| <b>713 Izolácie tepelné</b> |     |            |                                                                               | <b>50,253</b> |        |       |        | <b>0,008</b> |       |      |       |
| 25                          | 713 | 713111124  | Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, prístrelním | m2            | 7,920  | 3,691 | 29,233 | 0,00041      | 0,003 | 0,00 | 0,000 |
| 26                          | 283 | 2837620400 | Doska z ľahčeného polystyrénu 1000x500x30 17,5                                | ks            | 16,157 | 1,258 | 20,326 | 0,00032      | 0,005 | 0,00 | 0,000 |
| 27                          | 713 | 998713202  | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m            | %             | 0,496  | 1,400 | 0,694  | 0,00000      | 0,000 | 0,00 | 0,000 |

|                                             |     |         |                                          |                |        |         |         |              |       |      |       |
|---------------------------------------------|-----|---------|------------------------------------------|----------------|--------|---------|---------|--------------|-------|------|-------|
| <b>721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia</b> |     |         |                                          | <b>328,984</b> |        |         |         | <b>0,000</b> |       |      |       |
| 28                                          | 721 | 7211900 | Prevedenie hrubej inštalácia vodo, kanál | hod            | 16,000 | 8,024   | 128,384 | 0,00000      | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 29                                          | 286 | 2861000 | Materiál na hrubú inštaláciu             | kpl            | 1,000  | 200,600 | 200,600 | 0,00004      | 0,000 | 0,00 | 0,000 |

|                                               |     |             |       |               |       |                 |             |                     |                 |                 |            |
|-----------------------------------------------|-----|-------------|-------|---------------|-------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>725 Zdravotechnika - zariad'. predmety</b> |     |             |       | <b>17,300</b> |       |                 |             | <b>0,000</b>        |                 |                 |            |
| P.Č                                           | KCN | Kód položky | Popis | MJ            | Výkon | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť jednotková | Hmotnosť celkom | Prestavané [MJ] | Prestavané |

| 1    | 2   | 3           | 4                                                                                               | 5   | 6      | 7               | 8           | 9                   | 10              | 11              | 12           |
|------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 30   | 721 | 725110811   | Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933t                | súb | 2,000  | 5,075           | 10,150      | 0,00000             | 0,000           | 0,00            | 0,000        |
| 31   | 721 | 725240812   | Demontáž sprchovej misy bez výtokových armatúr mís 0,02450t                                     | súb | 2,000  | 3,549           | 7,098       | 0,00000             | 0,000           | 0,00            | 0,000        |
| 32   | 721 | 998725202   | Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m                         | %   | 0,172  | 0,300           | 0,052       | 0,00000             | 0,000           | 0,00            | 0,000        |
|      |     | <b>763</b>  | <b>Konštrukcie - drevostavby</b>                                                                |     |        |                 |             |                     |                 |                 | <b>0,000</b> |
| 33   | 763 | 763133420   | Sadrokartónový podhľad impregnovaný                                                             | m2  | 7,920  | 24,299          | 192,448     | 0,01674             | 0,133           | 0,00            | 0,000        |
| 34   | 763 | 763133810   | Montáž zavesenej nosnej konštrukcia z oceľových profilov SDK podhľad                            | m2  | 7,920  | 11,026          | 87,326      | 0,00035             | 0,003           | 0,00            | 0,000        |
| 35   | 763 | 998763201   | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m                                           | %   | 2,798  | 4,500           | 12,591      | 0,00000             | 0,000           | 0,00            | 0,000        |
|      |     | <b>766</b>  | <b>Konštrukcie stolárske</b>                                                                    |     |        |                 |             |                     |                 |                 | <b>0,000</b> |
| 36   | 766 | 766661112   | Montáž dverového krídla kompletiz. otváracého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové | ks  | 2,000  | 3,972           | 7,944       | 0,00000             | 0,000           | 0,00            | 0,000        |
| 37   | 611 | 6116020900  | Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm                                              | ks  | 2,000  | 62,137          | 124,274     | 0,01750             | 0,035           | 0,00            | 0,000        |
| 38   | 766 | 998766202   | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                           | %   | 1,322  | 0,800           | 1,058       | 0,00000             | 0,000           | 0,00            | 0,000        |
|      |     | <b>771</b>  | <b>Podlahy z dlaždíc</b>                                                                        |     |        |                 |             |                     |                 |                 | <b>0,000</b> |
| 39   | 771 | 771575207   | Montáž podláh z dlaždíc keramických                                                             | m2  | 21,530 | 11,483          | 247,229     | 0,00491             | 0,106           | 0,00            | 0,000        |
| 40   | 597 | 5976412900  | Dlaždice keramické                                                                              | m2  | 21,961 | 10,831          | 237,860     | 0,02000             | 0,439           | 0,00            | 0,000        |
| 41   | 771 | 771589793   | Príplatok k cene za špárovaciu hmotu                                                            | m2  | 21,530 | 0,822           | 17,698      | 0,00000             | 0,000           | 0,00            | 0,000        |
| 42   | 771 | 998771202   | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m                               | %   | 5,028  | 3,900           | 19,609      | 0,00000             | 0,000           | 0,00            | 0,000        |
|      |     | <b>781</b>  | <b>Dokončovacie práce a obklady</b>                                                             |     |        |                 |             |                     |                 |                 | <b>0,000</b> |
| 43   | 771 | 781445017   | Montáž obkladov stien z obkladačiek keramických do tmelu                                        | m2  | 41,650 | 13,841          | 576,478     | 0,00288             | 0,120           | 0,00            | 0,000        |
| 44   | 597 | 5976582100  | Obkladačky keramické                                                                            | m2  | 42,483 | 10,682          | 453,803     | 0,02100             | 0,892           | 0,00            | 0,000        |
| 45   | 771 | 781449705   | Príplatok za škárovaciu hmotou                                                                  | m2  | 41,650 | 0,913           | 38,026      | 0,00093             | 0,039           | 0,00            | 0,000        |
| 46   | 771 | 998781202   | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m                               | %   | 10,683 | 2,200           | 23,503      | 0,00000             | 0,000           | 0,00            | 0,000        |
|      |     | <b>783</b>  | <b>Dokončovacie práce - nátery</b>                                                              |     |        |                 |             |                     |                 |                 | <b>0,000</b> |
| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                                                           | MJ  | Výkon  | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť jednotková | Hmotnosť celkom | Prestavané [MJ] | Prestavané   |

| 1  | 2   | 3       | 4                                    | 5   | 6      | 7       | 8       | 9       | 10    | 11   | 12    |
|----|-----|---------|--------------------------------------|-----|--------|---------|---------|---------|-------|------|-------|
| 47 | 783 | 78310   | Maľba stien, stropov, nátery zárubní | kpl | 1,000  | 250,750 | 250,750 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 48 | HZS | HZS-003 | Hrubá inštalácia elektro             | hod | 16,000 | 10,030  | 160,480 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 49 | 341 | 34101   | Použitý materiál                     | kpl | 1,000  | 250,750 | 250,750 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |

|             |  |  |  |                                     |  |  |  |              |  |  |  |              |
|-------------|--|--|--|-------------------------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--------------|
| <b>M</b>    |  |  |  | <b>Práce a dodávky M</b>            |  |  |  | <b>0,000</b> |  |  |  | <b>0,000</b> |
| <b>43-M</b> |  |  |  | <b>Montáž oceľových konštrukcií</b> |  |  |  | <b>0,000</b> |  |  |  | <b>0,000</b> |

|   |   |           |                                                                      |     |         |        |         |         |       |      |       |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|---------|---------|-------|------|-------|
| 0 | R | 767998101 | Pomocná oceľová konštrukcia nazavesenie elektrického bojlera o strop | hod | 4,000   | 7,001  | 28,004  | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 0 | R | 9799100   | Poplatok za skládku sute                                             | t   | 11,663  | 11,665 | 136,049 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 0 | R | 97991002  | Príplatok za každý km odvozu sute na skládku                         | t   | 250,755 | 0,362  | 90,773  | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |

**Celkom** 5 351,354 6,989 0,000

**VK STAV s.r.o.**  
Radlinského 17, 052 01 Sp. Nová Ves  
IČO: 31703470, IČ DPH: SK2020504475

Súpís vykonaných prác

Obdobie: 2.11.-15.12.2011

Stavba: Oprava kúpelní v domove dôchodcov

Objekt: 01 Oprava kúpelne M3.09 - Odpočet menej prác- upravená dispozícia

Objednávateľ: Dom dôchodcov Nálepko n.o.

Zhotoviteľ: VK STAV s.r.o., Spišská Nová Ves

Dátum: 15.12.2011

Spracoval:

JKSO:

Miesto:

| P.Č    | KCN | Kód položky | Popis                                                             | MJ                           | Výkon  | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť jednotková | Hmotnosť celkom | Prestavané [MJ] | Prestavané |
|--------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1      | 2   | 3           | 4                                                                 | 5                            | 6      | 7               | 8           | 9                   | 10              | 11              | 12         |
| PSV    |     |             |                                                                   | Práce a dodávky PSV          |        |                 |             | -671,484            |                 |                 |            |
| 771    |     |             |                                                                   | Podlahy z dlaždíc            |        |                 |             | -159,973            |                 |                 |            |
| 1      | 771 | 771575207   | Montáž podláh z dlaždíc keramických                               | m2                           | -6,900 | 11,483          | -79,233     | 0,00491             | -0,034          | 0,00            | 0,000      |
| 2      | 597 | 5976412900  | Dlaždice keramické                                                | m2                           | -6,900 | 10,831          | -74,734     | 0,02000             | -0,138          | 0,00            | 0,000      |
| 3      | 771 | 998771202   | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m | %                            | -1,540 | 3,900           | -6,006      | 0,00000             | 0,000           | 0,00            | 0,000      |
| 781    |     |             |                                                                   | Dokončovacie práce a obklady |        |                 |             | -511,511            |                 |                 |            |
| 4      | 597 | 59765800b   | Obkladačky - odpočet - CP pol. 44                                 | kp/l                         | -1,000 | 453,803         | -453,803    | 0,02100             | -0,021          | 0,00            | 0,000      |
| 5      | 771 | 781445017   | Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do       | m2                           | -3,165 | 13,841          | -43,807     | 0,00288             | -0,009          | 0,00            | 0,000      |
| 6      | 771 | 781449705   | Príplatok za škárovaciu hmotu                                     | m2                           | -3,165 | 0,913           | -2,890      | 0,00093             | -0,003          | 0,00            | 0,000      |
| 7      | 771 | 998781202   | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m | %                            | -5,005 | 2,200           | -11,011     | 0,00000             | 0,000           | 0,00            | 0,000      |
| Celkom |     |             |                                                                   |                              |        |                 |             | -671,484            |                 |                 |            |
|        |     |             |                                                                   |                              |        |                 |             | -0,205              |                 |                 |            |
|        |     |             |                                                                   |                              |        |                 |             | 0,000               |                 |                 |            |



Súpís vykonaných prác

Stavba: Oprava kúpeľní v domove dôchodcov  
Objekt: Oprava kúpeľní z dôvodu ich havarijného stavu - Sprcha prízemie

JKSO:  
Miesto:

Obdobie: 2.11.-15.12.2011

Objednávateľ: Dom dôchodcov Nálepko, n.o.  
Zhotoviteľ: VK STAV s.r.o., Spišská Nová Ves  
Dátum: 15.12.2011  
Spracoval:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Výkon | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť jednotková | Hmotnosť celkom | Prestavané [MJ] | Prestavané |
|------|-----|-------------|-------|----|-------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1    | 2   | 3           | 4     | 5  | 6     | 7               | 8           | 9                   | 10              | 11              | 12         |

| HSV |     | Práce a dodávky HSV                |                                                                          | 893,574 |       | 1,149  |        | 0,000   |       |      |       |
|-----|-----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|--------|---------|-------|------|-------|
| 6   |     | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |                                                                          | 79,902  |       | 0,686  |        | 0,000   |       |      |       |
| 1   | 011 | 632451136                          | Poter pieskovocementový hladený dreveným hladidlom hr. do 50 mm do spádu | m2      | 5,375 | 8,889  | 47,778 | 0,12209 | 0,656 | 0,00 | 0,000 |
| 2   | 011 | 642942111                          | Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2                 | ks      | 1,000 | 8,369  | 8,369  | 0,01886 | 0,019 | 0,00 | 0,000 |
| 3   | 553 | 5533194600                         | Zárubňa oceľová CGU 90x197x10cm                                          | ks      | 1,000 | 23,755 | 23,755 | 0,01130 | 0,011 | 0,00 | 0,000 |

| 9  |     | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |                                                                            |     |       |         | 785,242 |         |       | 0,463 |       | 0,000 |  |
|----|-----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|--|
| 4  | HZS | HZS-003                             | Oprava omietok okolo zárubní a obkladov                                    | hod | 8,000 | 8,024   | 64,192  | 0,00000 | 0,000 | 0,00  | 0,000 |       |  |
| 5  | 221 | 935112111                           | Osadenie žľabu do betónu                                                   | m   | 1,700 | 7,200   | 12,240  | 0,13691 | 0,233 | 0,00  | 0,000 |       |  |
| 6  | 592 | 59229PC                             | Odvodňovací žľab                                                           | ks  | 2,000 | 276,828 | 553,656 | 0,05700 | 0,114 | 0,00  | 0,000 |       |  |
| 7  | 592 | 59229PC1                            | Odvodňovací žľab - dopravné a obstarávacie náklady 10%                     | ks  | 2,000 | 27,683  | 55,366  | 0,05700 | 0,114 | 0,00  | 0,000 |       |  |
| 8  | HZS | HZS-004                             | Napojenie odvodňovacích žľabov na kanalizáciu                              | hod | 8,000 | 8,024   | 64,192  | 0,00000 | 0,000 | 0,00  | 0,000 |       |  |
| 9  | 013 | 965081812                           | Búranie dlažieb keramických -0,065 t                                       | m2  | 5,375 | 2,494   | 13,405  | 0,00000 | 0,000 | 0,00  | 0,000 |       |  |
| 10 | 013 | 968061125                           | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2      | ks  | 1,000 | 0,508   | 0,508   | 0,00000 | 0,000 | 0,00  | 0,000 |       |  |
| 11 | 013 | 968062455                           | Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t                  | m2  | 1,400 | 5,180   | 7,252   | 0,00115 | 0,002 | 0,00  | 0,000 |       |  |
| 12 | 013 | 971033631                           | Vybúranie otvorov v murive tehľ. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm -0,270 t      | m2  | 0,394 | 3,794   | 1,495   | 0,00055 | 0,000 | 0,00  | 0,000 |       |  |
| 13 | 013 | 979081111                           | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                          | t   | 0,614 | 10,034  | 6,161   | 0,00000 | 0,000 | 0,00  | 0,000 |       |  |
| 14 | 013 | 979081121                           | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km              | t   | 3,070 | 0,362   | 1,111   | 0,00000 | 0,000 | 0,00  | 0,000 |       |  |
| 15 | 013 | 979082111                           | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                | t   | 0,614 | 6,376   | 3,915   | 0,00000 | 0,000 | 0,00  | 0,000 |       |  |
| 16 | 013 | 979082121                           | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t   | 2,456 | 0,712   | 1,749   | 0,00000 | 0,000 | 0,00  | 0,000 |       |  |

| P.Č                                      | KCN | Kód položky | Popis                                                                                            | MJ  | Výkon | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť jednotková | Hmotnosť celkom | Prestavané [MJ] | Prestavané |
|------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1                                        | 2   | 3           | 4                                                                                                | 5   | 6     | 7               | 8           | 9                   | 10              | 11              | 12         |
| 99 Presun hmôt HSV                       |     |             |                                                                                                  |     |       |                 |             |                     |                 |                 |            |
| 17                                       | 014 | 999281111   | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                | t   | 1,149 | 24,743          | 28,430      | 0,00000             | 0,000           |                 | 0,000      |
| PSV Práce a dodávky PSV                  |     |             |                                                                                                  |     |       |                 |             |                     |                 |                 |            |
| 711 Izolácie proti vode a vlhkosti       |     |             |                                                                                                  |     |       |                 |             |                     |                 |                 |            |
| 18                                       | 711 | 711462302   | Zhotovenie izolácie - Tekutá hydroizolácia 2x náter                                              | m2  | 6,215 | 12,658          | 78,669      | 0,00000             | 0,000           | 0,00            | 0,000      |
| 19                                       | 711 | 998711202   | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m                              | %   | 0,787 | 2,650           | 2,086       | 0,00000             | 0,000           | 0,00            | 0,000      |
| 725 Zdravotechnika - zariadenia predmety |     |             |                                                                                                  |     |       |                 |             |                     |                 |                 |            |
| 20                                       | 721 | 725110811   | Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933t                 | súb | 1,000 | 5,075           | 5,075       | 0,00000             | 0,000           | 0,00            | 0,000      |
| 21                                       | 721 | 725119305   | Montáž záchodovej misy kombinovanej                                                              | súb | 1,000 | 24,233          | 24,233      | 0,00204             | 0,002           | 0,00            | 0,000      |
| 22                                       | 721 | 725240812   | Demontáž sprchovej misy bez výtokových armatúr mís 0,02450t                                      | súb | 1,000 | 3,549           | 3,549       | 0,00000             | 0,000           | 0,00            | 0,000      |
| 23                                       | 721 | 998725202   | Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m                              | %   | 0,329 | 0,300           | 0,099       | 0,00000             | 0,000           | 0,00            | 0,000      |
| 766 Konštrukcie stolárske                |     |             |                                                                                                  |     |       |                 |             |                     |                 |                 |            |
| 24                                       | 766 | 766661112   | Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové | ks  | 1,000 | 3,972           | 3,972       | 0,00000             | 0,000           | 0,00            | 0,000      |
| 25                                       | 611 | 6116020900  | Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm                                               | ks  | 1,000 | 62,137          | 62,137      | 0,01750             | 0,018           | 0,00            | 0,000      |
| 26                                       | 766 | 998766202   | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                            | %   | 0,661 | 0,800           | 0,529       | 0,00000             | 0,000           | 0,00            | 0,000      |
| 771 Podlahy z dlaždíc                    |     |             |                                                                                                  |     |       |                 |             |                     |                 |                 |            |
| 27                                       | 771 | 771575207   | Montáž podláh z dlaždíc keramických                                                              | m2  | 5,375 | 11,483          | 61,721      | 0,00491             | 0,026           | 0,00            | 0,000      |
| 28                                       | 597 | 5976412900  | Dlaždice keramické                                                                               | m2  | 5,483 | 10,831          | 59,386      | 0,02000             | 0,110           | 0,00            | 0,000      |
| 29                                       | 771 | 771579793   | Príplatok za špárovaciu hmotu                                                                    | m2  | 5,375 | 0,822           | 4,418       | 0,00000             | 0,000           | 0,00            | 0,000      |
| 30                                       | 771 | 998771202   | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                | %   | 1,255 | 3,900           | 4,895       | 0,00000             | 0,000           | 0,00            | 0,000      |
| M Práce a dodávky M                      |     |             |                                                                                                  |     |       |                 |             |                     |                 |                 |            |
| 60,220 0,000 0,000                       |     |             |                                                                                                  |     |       |                 |             |                     |                 |                 |            |

| P.Č | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Výkon | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť jednotková | Hmotnosť celkom | Prestavané [MJ] | Prestavané |
|-----|-----|-------------|-------|----|-------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1   | 2   | 3           | 4     | 5  | 6     | 7               | 8           | 9                   | 10              | 11              | 12         |

43-M

|   |   |     |                                                           |     |       |        |        |         |       |      |       |
|---|---|-----|-----------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|---------|-------|------|-------|
| 0 | R | 771 | Doplnenie obkladov okolo podlahy - poškodené pri pokládke | kpl | 1,000 | 60,220 | 60,220 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
|---|---|-----|-----------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|---------|-------|------|-------|

Celkom

1 264,563

1.305

0,000

0,000

0,000

VK stav s.r.o.

Radlinského 17, 052 01 Sp. Nová Ves  
IČO: 31703470, IČ DPH: SK2020504475

Súpis vykonaných prác

Stavba: Oprava kúpeľní v domove dôchodcov  
Objekt: Oprava kúpeľní z dôvodu ich havarijného stavu - Sprcha I. poschodie

JKSO:  
Miesto:

Objednávateľ: Dom dôchodcov Nálepko, n.o.  
Zhotoviteľ: VK STAV s.r.o., Spišská Nová Ves  
Dátum: 15.12.2011  
Spracoval:

Obdobie: 2.11.-15.12.2011

| P.Č | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Výkon | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť jednotková | Hmotnosť celkom | Prestavané [MJ] | Prestavané |
|-----|-----|-------------|-------|----|-------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1   | 2   | 3           | 4     | 5  | 6     | 7               | 8           | 9                   | 10              | 11              | 12         |

| HSV |     | Práce a dodávky HSV                |                                                                          | 904,964 |       | 1,149  |        | 0,000   |       |      |       |
|-----|-----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|--------|---------|-------|------|-------|
| 6   |     | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |                                                                          | 79,902  |       | 0,686  |        | 0,000   |       |      |       |
| 1   | 011 | 632451136                          | Poter pieskovocementový hladený dreveným hladidlom hr. do 50 mm do spádu | m2      | 5,375 | 8,889  | 47,778 | 0,12209 | 0,656 | 0,00 | 0,000 |
| 2   | 011 | 642942111                          | Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2                 | ks      | 1,000 | 8,369  | 8,369  | 0,01886 | 0,019 | 0,00 | 0,000 |
| 3   | 553 | 5533194600                         | Zárubňa oceľová CGU 90x197x10cm                                          | ks      | 1,000 | 23,755 | 23,755 | 0,01130 | 0,011 | 0,00 | 0,000 |

| 9  |     | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |                                                                       |     |       |         | 796,632 |         |       | 0,463 |       | 0,000 |
|----|-----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 4  | HZS | HZS-003                             | Oprava omietok okolo zárubní a obkladov                               | hod | 8,000 | 8,024   | 64,192  | 0,00000 | 0,000 | 0,00  | 0,000 |       |
| 5  | 221 | 935112111                           | Osadenie žľabu do betónu                                              | m   | 1,700 | 7,200   | 12,240  | 0,13691 | 0,233 | 0,00  | 0,000 |       |
| 6  | 592 | 59229PC                             | Odvodňovací žľab                                                      | ks  | 2,000 | 276,828 | 553,656 | 0,05700 | 0,114 | 0,00  | 0,000 |       |
| 7  | 592 | 59229PC1                            | Odvodňovací žľab - dopravné a obstarávacie náklady 10%                | ks  | 2,000 | 27,683  | 55,366  | 0,05700 | 0,114 | 0,00  | 0,000 |       |
| 8  | HZS | HZS-004                             | Napojenie odvodňovacích žľabov na kanalizáciu                         | hod | 8,000 | 8,024   | 64,192  | 0,00000 | 0,000 | 0,00  | 0,000 |       |
| 9  | 013 | 965081812                           | Búranie dlažieb keramických -0,065 t                                  | m2  | 5,375 | 2,494   | 13,405  | 0,00000 | 0,000 | 0,00  | 0,000 |       |
| 10 | 013 | 968061125                           | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2 | ks  | 1,000 | 0,508   | 0,508   | 0,00000 | 0,000 | 0,00  | 0,000 |       |
| 11 | 013 | 968062455                           | Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t             | m2  | 1,400 | 5,180   | 7,252   | 0,00115 | 0,002 | 0,00  | 0,000 |       |
| 12 | 013 | 971033631                           | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm -0,270 t | m2  | 0,394 | 3,794   | 1,495   | 0,00055 | 0,000 | 0,00  | 0,000 |       |
| 13 | 013 | 979011131                           | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m                      | t   | 0,614 | 14,119  | 8,669   | 0,00000 | 0,000 | 0,00  | 0,000 |       |
| 14 | 013 | 979011141                           | Príplatok za každých ďalších 3.5 m                                    | t   | 0,614 | 4,431   | 2,721   | 0,00000 | 0,000 | 0,00  | 0,000 |       |
| 15 | 013 | 979081111                           | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                     | t   | 0,614 | 10,034  | 6,161   | 0,00000 | 0,000 | 0,00  | 0,000 |       |
| 16 | 013 | 979081121                           | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km         | t   | 3,070 | 0,362   | 1,111   | 0,00000 | 0,000 | 0,00  | 0,000 |       |
| 17 | 013 | 979082111                           | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m           | t   | 0,614 | 6,376   | 3,915   | 0,00000 | 0,000 | 0,00  | 0,000 |       |

| P.Č                                             | KCN | Kód položky | Popis                                                                                            | MJ  | Výkon | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť jednotková | Hmotnosť celkom | Prestávané [MJ] | Prestávané |
|-------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1                                               | 2   | 3           | 4                                                                                                | 5   | 6     | 7               | 8           | 9                   | 10              | 11              | 12         |
| 18                                              | 013 | 979082121   | Vnútrostavenisková doprava sútiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                       | t   | 2,456 | 0,712           | 1,749       | 0,00000             | 0,000           | 0,00            | 0,000      |
| <b>99 Presun hmôt HSV</b>                       |     |             |                                                                                                  |     |       |                 |             |                     |                 |                 |            |
| 19                                              | 014 | 999281111   | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                | t   | 1,149 | 24,743          | 28,430      | 0,00000             | 0,000           | 0,00            | 0,000      |
| <b>PSV Práce a dodávky PSV</b>                  |     |             |                                                                                                  |     |       |                 |             |                     |                 |                 |            |
| <b>711 Izolácie proti vode a vlhkosti</b>       |     |             |                                                                                                  |     |       |                 |             |                     |                 |                 |            |
| 20                                              | 711 | 711462302   | Zhotovenie izolácie - Tekutá hydroizolácia 2x náter                                              | m2  | 6,215 | 12,658          | 78,669      | 0,00000             | 0,000           | 0,00            | 0,000      |
| 21                                              | 711 | 998711202   | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m                              | %   | 0,787 | 2,650           | 2,086       | 0,00000             | 0,000           | 0,00            | 0,000      |
| <b>725 Zdravotechnika - zariadenia predmety</b> |     |             |                                                                                                  |     |       |                 |             |                     |                 |                 |            |
| 22                                              | 721 | 725110811   | Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933t                 | súb | 1,000 | 5,075           | 5,075       | 0,00000             | 0,000           | 0,00            | 0,000      |
| 23                                              | 721 | 725119305   | Montáž záchodovej misy kombinovanej                                                              | súb | 1,000 | 24,233          | 24,233      | 0,00204             | 0,002           | 0,00            | 0,000      |
| 24                                              | 721 | 725240812   | Demontáž sprchovej misy bez výtokových armatúr mís 0,02450t                                      | súb | 1,000 | 3,549           | 3,549       | 0,00000             | 0,000           | 0,00            | 0,000      |
| 25                                              | 721 | 998725202   | Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m                              | %   | 0,329 | 0,300           | 0,099       | 0,00000             | 0,000           | 0,00            | 0,000      |
| <b>766 Konštrukcie stolárske</b>                |     |             |                                                                                                  |     |       |                 |             |                     |                 |                 |            |
| 26                                              | 766 | 766661112   | Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové | ks  | 1,000 | 3,972           | 3,972       | 0,00000             | 0,000           | 0,00            | 0,000      |
| 27                                              | 611 | 6116020900  | Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 90x197 cm                                               | ks  | 1,000 | 62,137          | 62,137      | 0,01750             | 0,018           | 0,00            | 0,000      |
| 28                                              | 766 | 998766202   | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                            | %   | 0,661 | 0,800           | 0,529       | 0,00000             | 0,000           | 0,00            | 0,000      |
| <b>771 Podlahy z dlaždíc</b>                    |     |             |                                                                                                  |     |       |                 |             |                     |                 |                 |            |
| 29                                              | 771 | 771575207   | Montáž podláh z dlaždíc keramických                                                              | m2  | 5,375 | 11,483          | 61,721      | 0,00491             | 0,026           | 0,00            | 0,000      |
| 30                                              | 597 | 5976412900  | Dlaždice keramické                                                                               | m2  | 5,483 | 10,831          | 59,386      | 0,02000             | 0,110           | 0,00            | 0,000      |
| 31                                              | 771 | 771579793   | Príplatok k cene za špárovaciu hmotu                                                             | m2  | 5,375 | 0,822           | 4,418       | 0,00000             | 0,000           | 0,00            | 0,000      |
| 32                                              | 771 | 998771202   | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                | %   | 1,255 | 3,900           | 4,895       | 0,00000             | 0,000           | 0,00            | 0,000      |

| P.Č.                       | KCN | Kód položky | Popis                                                     | MJ  | Výkon | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť jednotková | Hmotnosť celkom  | Prestavané [MJ] | Prestavané   |
|----------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|-------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 1                          | 2   | 3           | 4                                                         | 5   | 6     | 7               | 8           | 9                   | 10               | 11              | 12           |
| <b>M Práce a dodávky M</b> |     |             |                                                           |     |       |                 |             |                     |                  |                 |              |
| <b>43-M</b>                |     |             |                                                           |     |       |                 |             |                     |                  |                 |              |
| 0                          | R   | 2100001     | Úprava elektrickej inštalácie podľa požiadaviek investora | kpl | 1,000 | 60,785          | 60,785      | 0,00000             | 0,000            | 0,00            | 0,000        |
| <b>Celkom</b>              |     |             |                                                           |     |       |                 |             |                     | <b>1 276,518</b> | <b>1,305</b>    | <b>0,000</b> |

**Celkom**

**1 276,518**

**1,305**

**0,000**



**vk stav s.r.o.**  
 Radlinského 17, 052 01 Sp. Nova Ves  
 IČO: 31703470, IČ DPH: SK2020504475
